




वार्षिक योजना अनुगमन प्रतिवेदन, २०८३



सिस्ने गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रुकुम (पूर्वी भाग)

१. पृष्ठभूमि:

सिस्ने गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आ.व. २०८२/०८३ मा योजना शाखाले योजना तथा अनुगमन सम्बन्धमा विविध कार्यहरू गरेको छ। पहिलो चौमासिकमा विभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्व तथा श्रावन, भदौ र असोज महिनामा अत्यधिक मात्रामा वर्षातका कारण योजना शाखाले सोचेजस्तो लक्ष पुरा गर्न सकेन। आ.व. २०८२/०८३ का लागि विनियोजित योजनाहरूमध्ये रु. ५,००,०००। (पाँच लाख) भन्दा साना योजनाहरू वडा स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने र ५,००,०००। (पाँच लाख) देखि माथिका योजनाहरू पालिका स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरियो।

सिस्ने गाउँपालिकाको योजना तथा अनुगमन शाखाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गाउँपालिकाको समग्र विकास, योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनका कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ। सिस्ने गाउँपालिकाका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण भौतिक निर्माण योजनाहरू योजना शाखामा सम्झौता भई कार्य सञ्चालन भएको थियो भने भुक्तानी टिनपनी पनि योजना शाखाबाटै उठान गरियो।

२. योजना अनुगमन समितिको संरचना:

क. पालिका स्तरीय अनुगमन समिति: (सिस्ने गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ को दफा ३ संग सम्बन्धित)

क. उपाध्यक्ष	संयोजक
ख. एकजना महिला सहित कार्यपालिका सदस्यबाट २ जना	सदस्य
ग. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	सदस्य
घ. पूर्वाधार शाखा प्रमुख	सदस्य
ड. योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख	सदस्य सचिव

ख. वडा स्तरीय अनुगमन समिति: (सिस्ने गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ को दफा ८ संग सम्बन्धित)

अ. वडा अध्यक्ष	संयोजक
आ. योजना सञ्चालन भएको टोलको वडा सदस्य	सदस्य
इ. वडा हेर्ने प्राविधिक	सदस्य
ई. वडा सचिव	सदस्य सचिव

३. वार्षिक निर्माण योजनाहरू संक्षेपमा:

आ.व. २०८२/०८३ मा सिस्ने गाउँपालिका द्वारा कार्यान्वयन भइ फरफारक गरिएका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित बजेट रु.	कार्यान्वयन वडा	कैफियत
१	श्री जनसेवा आ.वि. चुप्राबोटको छाना मर्मत	ने.समानिकरण	२२००००	२	समिति
२	शसत्र प्रहरी वल रुकुम (पूर्वी भाग) को कार्यालय भवनहरू मर्मत	आन्तरीक श्रोत	२४५२०४	६	कोटेशन
३	वन तथा वातावरण संरक्षण	ने.समानिकरण	१९९२९१	६	कोटेशन
४	अधुरो पुस्तकालय भवनको तला थप	ने.समानिकरण	२८०००००	६	ठेक्का
५	धोदारा गोरेटो बाटो निर्माण भट्टेचौर	आन्तरीक श्रोत	७५०००	१	समिति
६	मारीपाखा चिउरेनी बसपार्क सडक	ने.समानिकरण	१६४६०००	६	सिल कोटेशन
७	झाक्रिखोला देखि खैबाड धारमारे लिखापाखा खानेपानी	ने.समानिकरण	५०००००	८	समिति
८	द्वारे झीङ्ग्री मुहान संरक्षण	ने.समानिकरण	२०००००	६	समिति
९	अधुरो सहकारी भवन निर्माण वडा नं. ४	ने.समानिकरण	६०००००	४	समिति
१०	आ.वि. अमलाचौर व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	१५००००	४	समिति
११	आ.वि. झाक्रिपोले शौचालय निर्माण तथा मर्मत	ने.समानिकरण	४०००००	४	समिति
१२	आ.वि. ढकालबारा गेट अन्य व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	३५००००	६	समिति
१३	आ.वि. नाथिगाडमा वाल निर्माण	ने.समानिकरण	४०००००	७	समिति
१४	आ.वि. भूरेहा विद्यालय भवन मर्मत	ने.समानिकरण	५०००००	८	समिति
१५	आ.वि. सिस्ने पोखरी आवास तथा कार्यालय व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	२०००००	१	समिति
१६	काँडा सामुदायिक भवन निर्माण	ने.समानिकरण	६०००००	४	समिति
१७	आ.वि. रातामाट मर्मत	ने.समानिकरण	१०००००	४	समिति
१८	कोट मा.वि. फिल्ड व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	५०००००	५	समिति
१९	गाउँपालिका परिसरमा बाटर फाउन्टेन निर्माण	ने.समानिकरण	१००००००	५	कोटेशन
२०	छिपखोला बस्तीमा अग्नी नियन्त्रण रेखा निर्माण	गा.पा. आन्तरीक	५०००००	२	समिति
२१	जनता मा.वि. छिप्रीदह शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	६०००००	६	समिति
२२	जनता मा.वि. पोखरा कार्यालय व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	४५००००	३	समिति
२३	झिमखोला खेलमैदान निर्माण	आन्तरीक श्रोत	१०००००	८	समिति
२४	ठस्के सान्डाँडा प्रतिकालय निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	२	समिति
२५	ढकालबारा स्वस्थयचौकी जानेबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	१५०००००	६	सिल कोटेशन
२६	तातो पानी सम्म पुग्ने सडक निर्माण र काँडा मरेना हुँदै दाङ जोड्ने कृषि सडक निर्माण	ने.समानिकरण	९०००००	३	कोटेशन

२७	धपे पानी भर्ना हुदै गोत्ले जानेबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	५०००००	८	समिति
२८	निर्मित सडकको मर्मत सम्हार (पूर्वाधार एम्बुलेन्स)	ने.समानिकरण	२५०००००	३ देखि ८	कोटेसन २ वटा
२९	नाथिगार मलामी प्रतिकालय निर्माण	ने.समानिकरण	३०००००	७	समिति
३०	पशु नियन्त्रण गर्नकव लागि ट्रेभिज निर्माण	लु. राजश्व बाँडफाँड	१०००००	५	अमानत
३१	पाटापुजा गर्ने देखि कलैना सम्म सडक	आन्तरिक श्रोत	५०००००	६	कोटेसन
३२	पालिकाको परिसरको पार्किङ तथा अन्य संरचना र गाउँपालिका क्षेत्र भित्र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	ने.समानिकरण	४५०००००	५	ठेक्का
३३	पोखरा सामुदायिक भवन अधुरो काम सम्पन्न	ने.समानिकरण	८०००००	३	समिति
३४	बर्नाखोली मैदान ट्रयाकको काम	ने.समानिकरण	३०००००	५	समिति
३५	बसपार्क खाल्डाबोट सडक निर्माण	ने.समानिकरण	२००००००	६	सिल कोटेसन
३६	मा.वि. बल्लेचौर आवास व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	५००००	१	समिति
३७	मा.वि. बल्लेचौर अधुरो भवन निर्माण	ने.समानिकरण	१०००००	१	समिति
३८	रुकुमकोटमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	१००००००	६	कोटेसन
३९	रुक्मिणी मा.वि. शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	६०००००	५	समिति
४०	लामपाखा विद्यालयमा खेलमैदान निर्माण	ने.समानिकरण	१०००००	१	समिति
४१	सान्चौर खेलमैदान निर्माण	ने.समानिकरण	३०००००	७	समिति
४२	सिस्ने शिक्षा क्याम्पसमा खानेपानी व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	२०००००	५	समिति
४३	रुलीखोला डाँडागाउँ भदेपानी हुदै मध्यपहाडी रोड सम्म मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	१५००००	५	समिति
४४	कौछे वडा कार्यालय कानेबाड र बैसपानी स्यालापाखा झिमखोला सडक स्तर उन्नती (LISP) सिस्ने ७ र ८	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	७६२५०००	७ र ८	ठेक्का
४५	धाउने अमलाचौर हुदै तितेखोला, चोक बजार बस्नेत टोल कार्की टोल कुदै रुलीखोला र कोरबास खोपीचार होर्दिङ सडक स्तर उन्नती (LISP) सिस्ने ४, ५ र ६	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	१३००००००	४, ५ र ६	ठेक्का
४६	तिसरा-सुद्री सिस्ने सडक स्तर उन्नति (LISP)	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	८००००००	२	ठेक्का
४७	लैपा खानेपानी योजना निर्माण	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	२००००००	२	समिति
४८	चोकबजार-बस्नेतटोल-कार्कीटोल-रुलिखोला सडक	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	९९२९५३	५	कोटेसन
४९	धाउने अमलाचौर तितेखोला सडक स्तर उन्नती	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	९८९६६४	४	कोटेसन
५०	आ.वि. सिस्ने पोखरी मेसनरी बाल	ने.समानिकरण	६०००००	१	

५१	पावरहाउस देखि आ.वि. ओखरेना सम्म बाटो मर्मत साथै खोलाहरुमा दुईवटा काठे स्याकु पुल निर्माण	ने.समानिकरण	३०००००	१	समिति
५२	बाल्लेचौर फिल्ड निर्माण लामपाखा	लु.समानिकरण	५०००००	१	समिति
५३	भट्टेचौर फिल्ड निर्माण	लु.समानिकरण	५०००००	१	समिति
५४	मूलबाटो पानीधारा देखि मा.वि. बल्लेचौर गेट सम्म सिँडी निर्माण	ने.समानिकरण	४०००००	१	समिति
५५	वडा कार्यालय परिसर घेराबार	ने.समानिकरण	२०००००	१	समिति
५६	सिस्ने स्वास्थ्यचौकी सुत्केरी आवास प्लास्टर	आन्तरिक श्रोत	१५००००	१	समिति
५७	चुमैजा बगर काठको पुल निर्माण	ने.समानिकरण	१४००००	२	समिति
५८	१ नं. वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा आवास भवन मर्मत	ने.समानिकरण	१०००००	१	अमानत
५९	आ.वि. खरिबोट फर्निचर व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	१५००००	२	समिति
६०	आधारभूत विद्यालय सुद्री भवन रंगरोगन	ने.समानिकरण	२५००००	२	समिति
६१	कुमा मौबारी किदा घोरेटोबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	६०००००	२	समिति
६२	छिपखोला खेलमैदान मर्मत (रोजगार साझेदारी)	ने.समानिकरण	१०००००	२	समिति
६३	छिपखोला बयाले घोरेटो बाटो मर्मत (रोजगार साझेदारी)	ने.समानिकरण	२५००००	२	समिति
६४	तुवाङ देखि खरिबोट सम्म घोरेटो बाटो निर्माण (रोजगार)	ने.समानिकरण	१०००००	२	समिति
६५	तिपतरा खेलमैदान मर्मत तथा निर्माण	ने.समानिकरण	४०००००	२	समिति
६६	नायगाड सहिद गेटहुदै स्वास्थ्य चौकी सम्म सडक ट्रयाक निर्माण	ने.समानिकरण	३०००००	२	समिति
६७	सुद्री सामुदायिक भवन घेराबार तथा व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	३०००००	२	समिति
६८	सामुदायिक भवन निर्माण गवाचा	ने.समानिकरण	६०००००	२	समिति
६९	विपद व्यवस्थापन (ग्याविड भर्ने)	प्र. राजश्व	५००००	३	अमानत
७०	पुल्ल्या धारादेखि ढाँराटोल हुदै हाइवे जोड्ने बाटो ग्रावेल	ने.समानिकरण	१०००००	३	समिति
७१	राक्से फिल्ड बस्ती हुँदै डोडखोला कुर्लापाखा जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	३	समिति
७२	मुलपानी नहर निर्माण	ने.समानिकरण	३०००००	३	समिति
७३	चौपाटी सामुदायिक भवन रङ्गरोगन बायरिड तथा शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	३	समिति
७४	पाँगा फिल्ड घेराबार	लु.समानिकरण	३०००००	३	समिति
७५	बागेधारा मन्दिर सभाहल र फिल्ड घेराबार	लु.समानिकरण	५०००००	३	समिति
७६	राक्से फिल्ड निर्माण तथा घेराबार	ने.समानिकरण	२०००००	३	समिति
७७	वडा कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण	ने.समानिकरण	१००००००	३	समिति

७८	सहद स्मृति भवनमा शौचालय मर्मत सिंढी निर्माण र रंगरोगन	ने.समानिकरण	२५००००	३	कोटेशन
७९	अमला चौरदेखि चिउरीखोला ग्रामिन सडक निर्माण	ने.समानिकरण	६०००००	४	समिति
८०	टाकुरा काँडा सडक निर्माण	ने.समानिकरण	७०००००	४	समिति
८१	ठुला खाली देखि माने गैडा जाने बाटो निर्माण (साझेदारी)	ने.समानिकरण	१०००००	४	समिति
८२	पुरानो ढाकादेखि छट्टेखोला जानेबाटो (रोजगार)	ने.समानिकरण	१०००००	४	समिति
८३	गुडगुड देखि नयाँ ढाँका विद्यालय खानेपानी निर्माण	ने.समानिकरण	१५००००	४	समिति
८४	आधारभूत स्वास्थ्य इकाई अमलाचौर घेराबार निर्माण	आन्तरिक श्रोत	२०००००	४	समिति
८५	घंगारुचौर स्थल संरक्षणको लागि प्रतिकालय निर्माण	आन्तरिक श्रोत	२०००००	४	समिति
८६	जनजाती भवन काँडा शौचालय मर्मत तथा तारजाली निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	४	समिति
८७	जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दादिडमा फर्निचर खरिद निर्माण कार्य	ने.समानिकरण	२३००००	४	समिति
८८	स्वास्थ्य इकाई दादिड शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	४	समिति
८९	सानी मूल पधेरा सार्वजनिक धारा तथा काँडा प्रतिकालय निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	४	समिति
९०	अमलाचौर दलित आरण ढलान	ने.समानिकरण	३०००००	४	समिति
९१	रातामाटा विद्यालय तारजाली सहित घेराबार निर्माण	सङ्घीय विशेष र आन्तरिक	३५००००	४	समिति
९२	रुमालबारा मलामी विश्राम घर निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	५	समिति
९३	आ.वि. दुदिल्ला गैरा सिंढी तथा प्रतिकालय निर्माण	आन्तरिक श्रोत	३०००००	५	समिति
९४	ओखेनी खोला खानेपानी व्यवस्थापन ट्याङ्की र च्याम्बर	आन्तरिक श्रोत	१०००००	५	समिति
९५	कोट मा.वि. रुमालबारा रंगरोगन तथा मर्मत	ने.समानिकरण	२०००००	५	समिति
९६	खालधारा पिक्निक स्पोर्ट निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	५	समिति
९७	चेप्टे ढुङ्गा देखि चुनबाड जाने रोड सम्म सिंढी निर्माण	आन्तरिक श्रोत	२०००००	५	समिति
९८	ठुला खाली थोतेगैरा गोरेपानी देखि मानेगैडा जाने गोरेटोबाटो निर्माण	आन्तरिक श्रोत	१०००००	५	समिति
९९	डिलु बुढाको घरदेखि होमजंग घर्तीको घरसम्म सिंढी नर्मान	आन्तरिक श्रोत	१०००००	५	समिति
१००	थाग्ना उपल्नो ह्याप्ला हुदै भुमे ८ कुचिबाडको सिमाना सम्म मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	२००००००	५	समिति
१०१	चिउरापाटा गोरेटोबाटो बाल निर्माण	आन्तरिक श्रोत	१५००००	५	समिति

१०२	पुरानो स्कुल देखि उपल्लो सडक सम्म अपुरो सिढी निर्माण	आन्तरीक श्रोत	२०००००	५	समिति
१०३	फुसँगोठ थागना खालडाँडा सडक निर्माण	ने.समानिकरण	५२००००	५	समिति
१०४	भैसे खाल अपुरो सिढी निर्माण	आन्तरीक श्रोत	२५००००	५	समिति
१०५	मध्यपहाडी रानीकोट देखि कार्कीटोल सम्म सडक निर्माण	आन्तरीक श्रोत	२०००००	५	कोटेसन
१०६	ठुला खालीदेखी मानेगैडा मोटरबाटो निर्माण	आन्तरीक श्रोत	१०००००	५	समिति
१०७	रुमालबारा अपुरो भलिबल कोर्ड निर्माण	ने.समानिकरण	१५००००	५	समिति
१०८	रुमालबारा स्वास्थ्य केन्द्रमा फोहर व्यवस्थापनका लागि खाडल रकन्टेनर निर्माण	आन्तरीक श्रोत	१०००००	५	समिति
१०९	रलीखोला भदेपानी हुँदै मध्यपहाडी रोड सम्म मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	१५००००	५	समिति
११०	लक्षित समुहको लागि खानेपानी निर्माण तथा पाइप खरिद	लु. राजध्व	१५००००	५	समिति
१११	शिवशक्ति आ.वि. ह्याप्ला पर्खाल निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००		समिति
११२	सिला अधुरो सिङ्गि निर्माण	आन्तरीक श्रोत	२५००००	५	समिति
११३	सिस्ने पधेरो बाल निर्माण	आन्तरीक श्रोत	१५००००	५	समिति
११४	हाइवय देखि हमाल टोल सम्म सिङ्गि निर्माण	ने.समानिकरण	३०००००	५	
११५	मैदान देखि धुपी रुख सम्म सडक मर्मत	ने.समानिकरण	३०००००	५	
११६	भदालेबोट तेलपारा चौर मोटरबाटो निर्माण	आन्तरीक श्रोत	२५००००	६	
११७	कालिका मन्दिर बाँयातिर RCC बाटो	ने.समानिकरण	८०००००	६	कोटेसन
११८	कालिका बालविकास विद्यालय पाखागाउँ देखी मध्य पहाडी लोकमार्ग सम्म सिढी निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	६	
११९	कोलबोट देखि हत्यापाटा सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	ने.समानिकरण	१५००००	६	
१२०	खोपिचार सामुदायिक भवन निर्माण	ने.समानिकरण	६०००००	६	
१२१	चिउरेनी ठाडो मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	६	
१२२	ढकालबारा खानेपानी व्यवस्थापन योजना	ने.समानिकरण	६०००००	६	
१२३	पाखागाउँ क्रियापुत्री भवनको शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	६	
१२४	डैडा गाउँदेखि भदेपानी सम्म सिढी निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	६	
१२५	राणाखेत देखि पोखरा जोड्ने अधुरो मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	५०००००	६	

१२६	लुस्पा क्रियापुत्री घर तथा शौचालय निर्माण साथै पिपलको बोट चौतारी निर्माण	ने.समानिकरण	५०००००	६	कोटेसन
१२७	सृजना आ.वि. उखुवारीमा शौचालय निर्माण	ने.समानिकरण	२५००००	६	
१२८	कौछे प्रतिशालय देखि भिरघारी सम्म सडक स्तर उन्नती	ने.समानिकरण	२५००००	७	
१२९	सिस्नेरी देखि बोजेरी पुल जाने बाटो निर्माण	आन्तरीक श्रोत	१०००००	७	
१३०	कासिन्चौरमा फलामको पोल सहित जाली निर्माण	ने.समानिकरण	१५००००	७	
१३१	चिसापानी कुवा खेल मैदान निर्माण	लु. समानिकरण	२५००००	७	
१३२	चिसापानी झोलुङ्गे पुल जाने बाटो निर्माण	ने.समानिकरण	१०००००	७	
१३३	जुगे पानी र माथिल्लो तिलधारा खानेपानी मर्मत	ने.समानिकरण	१०००००	७	
१३४	तलि गाउँदेखि ढकलडेरा सम्म सिँडीबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	७	
१३५	तीनवटै महिला भवनलाई कार्यालय व्यवस्थापन ड्राइवाल तथा शौचालय व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	१५००००	७	
१३६	नौधारी खोला RCC पुल निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	७	
१३७	फुर्चेपर देखि उपल्लो कानेबाड सम्म खानेपानी निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	७	
१३८	बासठाना खानेपानी ट्याङ्कीमा वाल निर्माण	ने.समानिकरण	१०००००	७	
१३९	रातपरे टोल देखि भिरघारी सम्म सिँडीबाटो निर्माण (रोजगार)	ने.समानिकरण	८०००००	७	
१४०	रावत टोल देखि स्वास्थ्य इकाई सम्म सडकबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	५०००००	७	
१४१	लक्षित वर्ग प्रतिशालय व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	१५००००	७	
१४२	वडा कार्यालयको शौचालयको पहिरो व्यवस्थापन	ने.समानिकरण	१०००००	७	
१४३	खानेपानी मर्मत भुरुङ्गा	ने.समानिकरण	२०००००	८	
१४४	जामाखोला लघुजलविद्युत सामग्री खरीद तथा मर्मत	ने.समानिकरण	१०००००	८	कोटेसन
१४५	झाक्री डाँडा देखि चित्रिन गैरा सम्म सडक मर्मत	ने.समानिकरण	९०००००	८	
१४६	भुरुङ्गा खेलकुद मैदान निर्माण	ने.समानिकरण	५०००००	८	
१४७	महिला भवन प्लास्टर	ने.समानिकरण	२०००००	८	
१४८	लम्पाकोट खेलमैदान निर्माण प्रधानमन्त्री रोजगार संग साझेदार	ने.समानिकरण	९०००००	८	
१४९	स्यालापाखा विद्यालय भवन निर्माण	ने.समानिकरण	२०००००	८	
१५०	स्यालापाखा स्वास्थ्य इकाई पेन्टिङ	ने.समानिकरण	२०००००	८	कोटेसन

१५१	श्री त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण	ने. शसर्त	१३००००००	६	ठेका
१५२	पुल्लेनी पानी ट्रेस बृज (ह्याप्ला खोला झो.पु.)	ने. शसर्त	६०००००		रनिड विल
१५३	लम्पाकोट स्वास्थ्यचौकी अधुरो भवन निर्माण	लु. सशर्त	१००००००	८	
१५४	चोकबजार पाखागाउँ हुदै सेराखेत ढल निकास योजना सिस्ने -५	ने. समपुरक र समानिकरण	१९५०००००		ठेका
१५५	सुद्री देखि भट्टेचौर सम्म सडक निर्माण	ने. समपुरक	१५७३००००	२	रनिड विल (ठेका)
१५६	हाइवे देखि मैदान हुदै पुरानो स्कुल सम्म सडक स्तर उन्नती	लु. शसर्त	५००००००	५	ठेका
१५७	तिरेखोला अमलाचौर घाउने सडक स्तर उन्नती	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	१५००००००	४	ठेका
१५८	नेपाल बैंक चोक देखि दुरसंचार सम्म सडक स्तरोन्नती (LISP)	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	५००००००	६	ठेका
१५९	नेपाल बैंक चोक देखि दुरसंचार सम्म सडक स्तरोन्नती (LISP)	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	१००००००	६	कोटेसन
१६०	खाराचोक- चोक बजार- बस्नेतटोल- कार्कीटोल- रुलीखोला सडक स्तरोन्नती (LISP) सिस्ने ५ रुकुम (पूर्वी भाग)	ने. समानिकरण र ने. शसर्त	५२०००००	६	ठेका
१६१	जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा भवन निर्माण	ने. शसर्त	७१५००००	३	ठेका
१६२	सानोभेरी माध्यमिक विद्यालय लम्पाकोट भवन निर्माण	ने. शसर्त	६५०००००	८	रनिड विल (ठेका)
१६३	नवज्योती मा.वि. बल्लेचौर भवन निर्माण	ने. शसर्त	७४९२०६०	१	ठेका
१६४	७ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	लु. शसर्त	७४०००००	७	रनिड विल (ठेका)
१६५	सलली विसौना नायगाड सडक मर्मत	ने. समानिकरण	१००००००	२	कोटेसन
१६६	आधारभूत विद्यालय भुरुङ्गा घेराबार निर्माण	ने. विशेष	५०००००	८	
१६७	कालिका बालविकास केन्द्र पाखागाउँ गेट सहितको अधुरो घेराबार निर्माण	ने. विशेष	४०००००	६	
१६८	श्री नव विहानी आधारभूत विद्यालय ढकालबारा घेराबार निर्माण	ने. विशेष	५०००००	६	
१६९	प्रगति आधारभूत विद्यालय काँडा फर्निचर व्यवस्थापन	ने. विशेष	५०००००	४	
१७०	श्री हिमशिखर आ.वि. सुद्री गेट सहितको घेराबार	ने. विशेष	५०००००	२	
१७१	श्री सानोभेरी माध्यमिक विद्यालय लम्पाकोट छात्र छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण	ने. विशेष	१००००००	८	
१७२	श्री शिवशक्ति आ.वि. ह्याप्ला शौचालय निर्माण	ने. विशेष	४०००००	५	
१७३	सिस्ने आधारभूत विद्यालय रतुवामारे ऊट सहित घेराबार	ने. विशेष	५०००००	१	

१७४	आधारभूत विद्यालय झिमखोला अधुरो घेराबार निर्माण	ने.विशेष	६०००००	८	
१७५	श्री नवज्योती मा.वि. बल्लेचौर फर्निचर व्यवस्थापन	ने.विशेष	७०००००	१	
१७६	आधारभूत विद्यालय नाथिगार शौचालय निर्माण	ने.विशेष	५०००००	७	
१७७	श्री बाल विकास केन्द्र लैपा अधुरो घेराबार निर्माण	ने.विशेष	२०००००	२	
१७८	हिमालय आधारभूत विद्यालय ओखेना घेराबार	ने.विशेष	५०००००	१	
१७९	श्री हिमालय आधारभूत विद्यालय किंदा घेराबार निर्माण	ने.विशेष	५०००००	२	
१८०	श्री जनप्रिय मा.वि. दादिङ सिस्ने ४ मेसिनरी बाल सहितको घेराबार निर्माण	ने.विशेष	१००००००	४	
१८१	श्री हिमालय आधारभूत विद्यालय ओखरबोट विद्यालय भवन रङ्गरोगन	ने.विशेष	२०००००	२	
१८२	श्री जनप्रिय मा.वि. दादिङ सिस्ने ४ अधुरो भवन निर्माण	ने.समानिकरण	१००००००	४	
१८३	सानो डिग्रे साइकुमारी देखि गाउँसम्म स्ल्याब निर्माण	लु.समानिकरण	२५००००	८	
१८४	बागेधारा मन्दिर परिसर निर्माण	लु.समानिकरण	२५००००	३	
१८५	नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत रुक्मिणी मा.वि. मा भवन तला थप	स.शसर्त	१२०००००	५	
१८६	विज्ञान विषय विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रुक्मिणी मा.वि. प्रयोगशाला स्तरोन्नती	स.शसर्त	१५२०००	५	
१८७	स्वास्थ्य चौकी पोखरा रंगरोगन	स. राजश्व बाँडफाँड	१०००००	३	
१८८	थाक्ना उपल्नो ह्याप्ला हुँदै भूमे ८ कुचिबाडको सिमाना सम्म मोटरबाटो निर्माण	ने.समानिकरण	२९८७८८	६	कोटेसन
१८९	गापामा चिस्यान केन्द्रको मर्मत (गत वर्षको भुक्तानी बाँकी)	समपुरक	१८४०१७	५	कोटेसन
१९०	रुमालबारा खानेपानी गोदाम निर्माण	आन्तरीक श्रोत	१०००००	५	
जम्मा सम्झौता रकम रु.			१५,२६,३६,८६५।००		
जम्मा भुक्तानी रकम रु.			११,७०,३४,७५४।००		
ठेक्का घटी सम्झौता भएकोले सम्झौता रकम भन्दा भुक्तानी रकम कम भएको।					

४. योजना छनौट प्रक्रिया:

- वस्ती स्तरमा योजना छनौट (टोल विकास समितिका सदस्य र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा)
- वडा स्तरमा योजना संकलन तथा प्राथमिकता निर्धारण (लक्षित वर्ग)
- विषयगत समितिमा छलफल र प्राथमिकता निर्धारण (समावेशिता, आवश्यकता, दिर्घकालिन प्रभाव)

घ. वजेट विनियोजन

ड. गाउँसभाबाट अनुमोदन

५. योजना कार्यन्वयनको स्थिति:

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वजेट विनियोजन भएर सम्झौता भई भुक्तानी भएका योजनाहरूलाई विसलेसन गर्दा:

- जम्मा भौतिक निर्माणका योजना संख्या: २०४ वटा
- जम्मा सम्झौता भएका योजना संख्या: १९१ वटा (सूवाधार एम्बुलेन्स शिर्षकबाट २ वटा कोटेसन समेत)।
- सम्झौता नभएका योजनाको संख्या: १३ वटा
- जम्मा भुक्तानी योजनाको संख्या: १९१ वटा

क्र.सं.	वजेटको मात्रा	योजनाको संख्या	कैफियत
१	१ करोड देखि माथि	५	
२	५० लाख देखि १ करोड तल	८	
३	२० लाख देखि ५० लाख तल	४	
४	१० लाख देखि २० लाख तल	१२	
५	५ लाख देखि १० लाख तल	४८	
६	५ लाख भन्दा तल	११४	
जम्मा		१९१	

६. जम्मा काम सम्पन्न भई भुक्तानी गरिएका योजना संख्या र योजना खरिद तथा सम्झौता विधि:

क्र.सं.	योजना खरिद विधि	योजनाको संख्या	कैफियत
१	ठेक्का	१९	
२	सिल कोटेसन	३	
३	कोटेसन	२०	
४	अमानत	३	
५	निर्माण उपभोक्ता समिति	१४६	
जम्मा		१९१	

जम्मा भौतिक प्रगति: ९९% र जम्मा आर्थिक प्रगति ७७% (विनियोजित रकम भन्दा ठेक्का सम्झौता रकम कम भएकोले आर्थिक प्रगति कम देखिएको हो।)

७. अनुगमन कार्यको विवरण:

आ.व. २०८२/०८३ का लागि विनियोजित योजनाहरूमध्ये रु. ५,००,०००। (पाँच लाख) भन्दा साना योजनाहरू वडा स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन सहित वडाले भुक्तानी सिफारिस गर्‍यो र ५,००,०००। (पाँच लाख) र सो भन्दा माथिका योजनाहरू पालिका स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन दिइयो। जस्को विवरण तल उल्लेख गरिएको छ।

- ❖ जम्मा अनुगमन गरिएका योजना संख्या: १९१ वटा
- क. पालिका स्तरीय अनुगमन समिति: ७७ वटा
- ख. वडा स्तरीय अनुगमन समिति: ११४ वटा
- ❖ अनुगमनका केही नमुनाहरू:
- क. पालिका स्तरीय अनुगमनका नमुना:

अनुगमन कार्य
गता १२ को मद्दतमा (४) मा सम्पन्न।
योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट
मिति २०८२/०८/११

१. योजनाको नाम: श्री विष्णु सार्वजनिक विद्यालय छिप्रेडाँडा, स्याङ्जा जिल्ला
२. निर्माण उपगोष्ठा समितिको नाम: श्री विष्णु सार्वजनिक विद्यालय छिप्रेडाँडा
३. योजना कार्यान्वयन स्थान: श्री विष्णु सार्वजनिक विद्यालय छिप्रेडाँडा, स्याङ्जा जिल्ला
४. योजना मिति: २०८२/०८/०८
५. योजना निर्माण गुरु मिति: २०८२/०८/२०
६. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/११/२०
७. साइटको रकम: रु. ३,२५,४४९।९४
८. पेशेरी/सिप्यान्सको नाम: श्री
९. योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: योजनाको गुणस्तर लात र समय अनुसार सम्पन्न भएको।
१०. विज्ञापन का लागतमा परिवर्तन भए वा नभएको: नभएको
११. योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको अवस्था: विद्यालयमा सञ्चाल्य निर्माण भएकोले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक लाभ प्राप्त गर्न सहजता प्राप्त हुने।
१२. कार्यान्वयन गर्ने निकायको अधिकारिक प्रतिनिधिको अगुवा सदस्यता क्रमसँग नाम सम्पन्न भएको।
१३. अनुगमन कार्य/समितिबाट टिप्पणी, मुद्दाहरू र निर्णय: स्वीकृत लागू अनुमान अनुसार शैक्षिक निर्माण कार्य गरेको देखिन आएकाले प्रत्येक मूल्यांकन अवधिमाको किन भएपछि कोषी गरी अन्तिम प्रकृति अगोडी वडाउत्तुन।

अनुगमन गर्ने पदधिकारीहरू:

क्र.सं.	नाम थर	पद	स्थान
१	श्री योगेश रेग्मी	पाठ्यक्रम (अनुगमन समिति संयोजक)	जुम्ला
२	श्री करण खड्का	इन्जिनियर	झुम्ला
३	श्री मन्जु कुमारी बस्नेत	सब इन्जिनियर	झुम्ला
४	श्री पूर्ण बहादुर शि.एम.	सहायक प्रशासकीय अधिकृत	झुम्ला

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८३/०३/१८

- योजनाको नाम: नेपाल बैंक चोकदेखि दुरसंचार सम्म सडक स्तरोन्नती (कोटेश्वरबाट)
- योजना निर्माण फर्मको नाम र ठेगाना: सिद्ध मण्डली विन्डर्स प्रा.लि., सिस्ने-६, रकुम (पूर्वी भाग)
- योजना कार्यान्वयन स्थल: सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ६ छिप्रीदह, रकुम (पूर्वी भाग)
- सम्झौता मिति: २०८३/०२/१९
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८३/०२/२०
- सम्झौता रकम: रु. ९,८९,५६३।३० (सिस्ने गाउँपालिकाको २०% र USP को ८०%)
- निर्माणाधिन आयोजनाको अनुगमन गरिएको मिति: २०८३/०३/१८ (अनुगमन समितिबाट)
- डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन भए वा नभएको: नभएको
- योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन अथवा: सडक स्तरउन्नतीको काम लागत स्टामेट वमोजिम सकिएकाले वडा नं. ६ आला बासी तथा श्री त्रिभुवन जनता मा.वि. का शिनाक विद्यार्थीहरूलाई आवत जावत गर्नमा सहजता प्राप्त हुने।

- कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा: लागत मूल्याङ्कन वमोजिम काम सकिएको।
- अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन: प्राविधिक स्टामेट अनुरूप सडक स्तरउन्नती गर्ने कार्य सकिएकाले प्राविधिक मूल्याङ्कन वमोजिमको भुक्तानी निवेदन साथ पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढाउनुहुन।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू:

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	गोपाल रेउले	उपाध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	
२	अरुण कुमार ओली	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत	
३	करण खड्का	इन्जिनियर	
४	गोविन्द प्रकाश खड्का	प्राविधिक अधिकृत	
५	पूर्ण बहादुर वि.एम.	सहायक प्रशासकीय अधिकृत	

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८३/०३/१९

- योजनाको नाम: धाउने श्रमलाचौर तिर्खोला सडक स्तरउन्नती (USP कोटेशन)
- योजना निर्माण फर्मको नाम र ठेगाना: ए. एस. के. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सन्वायर्स प्रा.लि., मुसिकोट-१३, रकुम (पश्चिम भाग)
- योजना कार्यान्वयन स्थल: सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ४, रकुम (पूर्वी भाग)
- सम्झौता मिति: २०८३/०२/०७
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८३/०२/०७
- सम्झौता रकम: रु. ९,८९,५६३।३० (सिस्ने गाउँपालिकाको २०% र USP को ८०%)
- निर्माणाधिन आयोजनाको अनुगमन गरिएको मिति: २०८३/०३/१९ (अनुगमन समितिबाट)
- डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन भए वा नभएको: नभएको
- योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन अथवा: सडक स्तरउन्नतीको लागत स्टामेट वमोजिम सकिएकाले वडा नं. ३ र ४ का जनताहरूलाई आवत जावत तथा यातायातको साधन सञ्चालन गर्नमा सहजता प्राप्त हुने।

- कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा: लागत मूल्याङ्कन वमोजिम काम सकिएको।
- अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन: प्राविधिक स्टामेट अनुरूप सडक स्तरउन्नती गर्ने कार्य सकिएकाले प्राविधिक मूल्याङ्कन वमोजिमको भुक्तानी निवेदन साथ पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढाउनुहुन।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू:


क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	गोपाल रेउले	उपाध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	
२	अरुण कुमार ओली	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत	
३	करण खड्का	इन्जिनियर (पूर्वाधार शाखा प्रमुख)	
४	गोविन्द प्रकाश खड्का	प्राविधिक अधिकृत (पूर्वाधार शाखा)	
५	पूर्ण बहादुर वि.एम.	सहायक प्रशासकीय अधिकृत (योजना तथा अनुगमन शाखा)	

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८३/०३/२०

- योजनाको नाम: आधारभूत विद्यालय नथियाड शौचालय निर्माण
- निर्माण उपभोक्ता समितिको नाम: आधारभूत विद्यालय नथियाड, सिल्ले गा.पा.-७, खुम (पूर्वी भाग)
- योजना कार्यान्वयन स्थल: आधारभूत विद्यालय नथियाड, सिल्ले गा.पा.-७, खुम (पूर्वी भाग)
- सम्झौता मिति: २०८२/११/१०
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२/१२/२१
- योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८३/०३/०२
- सम्झौता रकम: रु. ५,७०,३५९.११
- पेशी/किस्ता निकासो: छैन
- योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय अनुसूच काम भएको।
- डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन भए वा नभएको: नभएको
- योजनाबाट अपेक्षित श्रुतिफल प्राप्त हुन सकेको अवस्था: लागत स्टोमेट अनुसार शौचालय निर्माणको कार्य भएकोले विद्यार्थीहरूलाई शौच गर्न सहजता प्राप्त हुने।
- कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा: सम्झौता वमोजिम काम सम्पन्न भएको।
- अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी: सुझाव र निर्देशन: स्वीकृत लागत अनुमानमा शौचालय निर्माण कार्य गरेको देखिन आएकोले प्रविधिक मूल्याङ्कन वमोजिमको विल भराई पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू:

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री गोपाल रेग्ने	उपाध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	
२	श्री करण खड्का	इन्जिनियर	
४	श्री हिमराज पुन	सब इन्जिनियर	
५	श्री पूर्ण नवाधुर वि.एम.	सहायक प्रशासकीय अधिकृत	

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको अन्तिम अनुगमन रिपोर्ट

मिति: २०८३/०१/०५

- योजनाको नाम: सामुदायिक भवन निर्माण योजना
- निर्माण उपभोक्ता समितिको नाम: सामुदायिक भवन निर्माण योजना उपभोक्ता समिति, सिल्ले - ७, खुम (पूर्वी भाग)
- योजना कार्यान्वयन स्थल: सिल्ले - ७, खुम (पूर्वी भाग)
- सम्झौता मिति: २०८२/१०/२७
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२/०१/०५
- योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/१२/१४
- सम्झौता रकम: रु. ७,१३,८२३.१९
- पेशी/किस्ता निकासो: छैन
- योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय अनुसूच काम भएको।
- डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन भए वा नभएको: नभएको
- योजनाबाट अपेक्षित श्रुतिफल प्राप्त हुन सकेको अवस्था: सामुदायिक भवन निर्माण भएकोले सामुदायिक भवनको आवश्यक परको सेवा भेला भई खुलफल तथा बैठक गर्न सहजता प्राप्त हुने।
- कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा: सम्झौता वमोजिम काम सम्पन्न भएको।
- अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी: सुझाव र निर्देशन: स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य गरेको देखिन आएकोले आलोचक मूल्याङ्कन वमोजिमको विल भराई पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन।

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू:

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री गोपाल रेग्ने	उपाध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	
२	करण खड्का	पूर्यांगर शाला प्रमुख (इन्जिनियर)	
३	अनूप कुमार ओली	पञ्चासन शाला प्रमुख (प्रशासकीय अधिकृत)	
४	सुर्जित आशी	सब इन्जिनियर (पूर्यांगर शाला)	

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको वडा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति: २०८२/०९/१६

१०. योजनाओं के नाम: नाथियाड मलामी प्रतिशालय निर्माण

२. योजना निर्माण उपभोक्ता समिति : नाथिगाड ग्लामी प्रतिशालय निर्माण उपभोक्ता समिति

३. योजना निर्माण स्थल: सिरने ०७ नाथिगाड रुकुम (पूर्वी भाग)

५. गोंजना निर्माण सरु मिति : २०८२/०८/१६

योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/१०/१५

सङ्ग्रीता रकम: ३,७४,५३९

योजना कार्यन्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: सन्तोषजनक

निर्माण उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: ७४,५३१

योजनाबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था: रहेको

०. सार्वजनिक मन्दीर तथा सामाजिक परिसर: २०८२/०९/१३

१. कार्यन्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा र

विषय.....

३ अन्तर्गत वर्ग / समितिको टिप्पणी, सहाय र निर्देशन.....

अनगमनं गन् पदाधिकारीहरु

क्र.सं	नाम धर	पद	हस्ताक्षर
१	मणिधर बुढा	बडा अध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	<i>[Signature]</i>
२	गोविन्द के सी	बडा सचिव (सदस्य)	
३	हिमराज पुत मगर	बडा प्राविधिक (सदस्य)	<i>[Signature]</i>
४	गणेश राज रेडुले	बडा सदस्य/बडाका अन्य कर्मचारी	<i>[Signature]</i>

अनसूची. ३

दफा ८ को उपदफा (१) मा सम्बन्धित,

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरीएको वडा स्तरीय योजना अन्तर्गत प्रविन्दन (नफा टाँको उपस्था (१) मा मयान्द्रा),

205105/08

[illegible]

योजना सम्पन्न भावों सिद्धि १०८०११०८१०८

समस्यांना रकम: १०००००/-

१००००५४

योजना कार्यान्वयनको प्रबन्ध तथा गणना

निर्माण उपभोगा समितिको लागि महागण १४५४२.१९

मानवाट आशिल्ले पणिकल पासून मनन अवस्था. अन्धम आवासा भाववृत्ता शक्तीमात्रा
र अस्मिता विरोधी बाधे घुट्या र निरासफाई भा. अणु. इ. इ. वाज्जे
मानवाट आशिल्ले पणिकल पासून मनन अवस्था. अन्धम आवासा भाववृत्ता शक्तीमात्रा

कार्यान्वयन में निकायों को अधिकारक प्रतिनिधि (प्रबधिक) को प्राणा.

[illegible]

अनगमणं गन् पदाधिकारादहः

क्रम	नाम शर	पद	समाप्ति
१	श्री हनुमान चालीसा	बड़ा अष्टाक्षर (अनुपासन मंत्रित संगोपक)	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
२	श्री परमेश्वर उपासना	मंत्र (सदस्य)	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
३	श्री गुरुदेव गीता	बड़ा प्रार्थिका (सदस्य)	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
४	श्री गीता के श्री	बड़ा सदस्य/बड़ा नाम अन्य सम्पादनी	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
५	श्री		ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



मिति २०८२।११।१२

- योजनाको नाम: राष्ट्रिय योजना
- योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: राष्ट्रिय योजना
- योजना निर्माण स्थल: राष्ट्रिय योजना
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२।०५।१५
- योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२।११।१२
- सम्झौता रकम: १.५०.००.००
- योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: रखेको
- निर्माण उपभोक्ता समितिको सागत सहभागिता: आएको
- योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको अवस्था: आएको
- सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिक्षण: आएको
- कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधि (प्राविधिक) को धारण: कोन
- अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी सुझाव र निर्देशन: आएको सुझाव दिइएको

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क्र.स	नाम	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री. <u>राष्ट्रिय योजना</u>	यडा अध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	<u>राष्ट्रिय योजना</u>
२.	श्री. <u>राष्ट्रिय योजना</u>	यडा सचिव (सदस्य)	<u>राष्ट्रिय योजना</u>
३.	श्री. <u>राष्ट्रिय योजना</u>	यडा प्राविधिक (सदस्य)	<u>राष्ट्रिय योजना</u>
४.	श्री. <u>राष्ट्रिय योजना</u>	यडा सदस्य/यडा अन्य कर्मचारी	<u>राष्ट्रिय योजना</u>

चौपाटी सायुदायिष्ठ भवन, काठमाडौं, नेपाल
मिति: २०८२।०९।०६

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
मिति: काठमाडौं, काठमाडौं, काठमाडौं

विषय: अनुगमन प्रतिवेदन सहित भुक्तानिका लागी निम्तोपत्र।

सिले गाउँपालिकाको आ.नं. २०८२/०५३ को स्थानमा वार्षिक विकास कार्यक्रमको तपसिल बमोजिमको योजना/कार्यक्रमको काम हुनेछो सम्पन्न हुनेछोको अवधिमा नियमित अनुगमन गर्ने वार्षिक योजना बमोजिम तयार भएको स्वीकृत प्रविधिक विवरण तथा लागत अनुमान बमोजिम कार्यरतमा मिलाउनु र प्रभावकारी हुने सम्पन्न गरेको पत्रको हुने प्रविधिक विवरण तथा मूल्याङ्कन बमोजिम रकम भुक्तानी दिने कुनै फरक गर्ने तथा फरक पर्ने गरी अनुगमन समितिका कार्य प्रविधिकारी विम्वर हुनेछो भनी निम्तोपत्र दिइनेछो।

- योजनाको नाम: चौपाटी सायुदायिष्ठ भवन, काठमाडौं, नेपाल
- योजना कार्यान्वयन स्थल: सिस्ने गा.पा. वडा नं. ३ चौपाटी
- योजना सम्झौता मिति: २०८२।०८।२५
- अनुगमन सुरु मिति: २०८२।०९।०५
- सदस्य सदस्य: ५ (४ पुरुष १ महिला)
- अनुगमन सम्पन्न मिति: २०८२।१०।२५
- योजनाको कुल लागत: २५०००००
- अनुगमनको लागत: ४९०८२।०९।०६
- सार्वजनिक सुनुवाई भएको मिति: २०८२।०९।०६
- सार्वजनिक सुनुवाई भएको मिति: २०८२।०९।०६
- अनुगमन समितिको बैठक भएको मिति: २०८२।०९।०६
- निकासी हुने रकम: २५०००००

अनुगमन समिति/पदाधिकारीहरू

सदस्य
श्री. राष्ट्रिय योजना (वडा)
संयोजक
श्री. राष्ट्रिय योजना (वडा)
सचिव
श्री. राष्ट्रिय योजना (वडा)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको बढा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति: २०८२/१०/२५

१. योजनाको नाम: बुगेपानी र माथिल्लो तिलधारा खानेपानी मर्मत आयोजना समिति
२. योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: बुगेपानी र माथिल्लो तिलधारा खानेपानी मर्मत आयोजना उपभोक्ता समिति

३. योजना निर्माण स्थल: सिस्ने ०७ तिलधारा लकुम (पूर्वी भाग)

४. योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२/०९/१०

५. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/१०/२१

६. सम्झौता रकम: १,१८,२५३.३७

७. योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: सन्तोषजनक

८. निर्माण उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: १८,२५३.३७




९. योजनाबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन सके अवस्था: रहेको

१०. सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिषद: २०८२/१०/२४

११. कार्यान्वयन गर्ने निकायको अधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा र प्रतिबद्धता:

१२. अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन:

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क्र.सं	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	सशिवर बुढा	बडा अध्यक्ष/अनुगमन समिति संयोजक	
२	गोविन्द के सी	बडा सचिव (सदस्य)	
३	हिमराज पुन मगर	बडा प्राविधिक (सदस्य)	
४	रुद्रा गुरुङ	बडा सदस्य/बडाका अन्य कर्मचारी	

अनुसूची-३

(वर्षा को उपदका (१) सँग सम्बन्धित)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको बढा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति: २०८२/११/२६

१. योजनाको नाम: अर्दोले कोट तेलघारा चौर नेरुकोटो निर्माण
२. योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: अर्दोले कोट तेलघारा चौर उपभोक्ता समिति
३. योजना निर्माण स्थल: अर्दोले कोट

४. योजना निर्माण सुरु मिति: २०८१/०८/१८

५. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/१०/१०

६. सम्झौता रकम: २,४०,०००/-

७. योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: राम्रो

८. निर्माण उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: ५०/-




९. योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सके अवस्था: राम्रो

१०. सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिषद: अर्दोले कोट

११. कार्यान्वयन गर्ने निकायको अधिकारिक प्रतिनिधि (प्राविधिक)को धारणा: राम्रो

१२. अनुगमन कर्ता/समितिको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन: राम्रो

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री पुष्पे प्र. खड्का	बडा अध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	
२	श्री सुशिला खड्का	बडा सचिव (सदस्य)	
३	श्री सुशिला खड्का	बडा प्राविधिक (सदस्य)	
४	श्री सुशिला खड्का	बडा सदस्य/बडाका अन्य कर्मचारी	



(रफा ८ को उपदफा १) संग सम्बन्धित)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको बडा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति २०८२/१०/१५

- योजनाको नाम: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना निर्माण स्थान: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२/१०/१५
- योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/१०/१५
- योजना कार्यन्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजनाबाट अपेक्षित प्रतिकूल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिक्षण: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- कार्यान्वयन गर्ने निकायको अधिकारिक प्रतिनिधि (प्राविधिक)को आगमन: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू:

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	बडा अध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
२	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	सचिव (सदस्य)	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
३	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	बडा प्राविधिक (सदस्य)	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
४	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	बडा सदस्य/बडाका अन्य कर्मचारी	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
५	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>		<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>



(रफा ८ को उपदफा १) संग सम्बन्धित)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको बडा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति: २०८२/१०/१५

- योजनाको नाम: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना निर्माण स्थान: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२/१०/१५
- योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/१०/१५
- योजना कार्यन्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजना उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- योजनाबाट अपेक्षित प्रतिकूल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिक्षण: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- कार्यान्वयन गर्ने निकायको अधिकारिक प्रतिनिधि (प्राविधिक)को आगमन: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय
- अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू: सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू:

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	बडा अध्यक्ष (अनुगमन समिति संयोजक)	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
२	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	सचिव (सदस्य)	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
३	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	बडा प्राविधिक (सदस्य)	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>
४	श्री <u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>	बडा सदस्य/बडाका अन्य कर्मचारी	<u>सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय</u>

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको वडा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति : २०८२/१०/१३



सिन्धु गाउँपालिका-३
सुर्खेत जिल्ला
२०७३

१. योजनाको नाम: आ.वि.नाथिगाडमा बासो निर्माण

२. योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: आ. वि. नाथिगाडको वि.व. स. समिति

३. योजना निर्माण स्थल: सिस्ने ०७ नाथिगाड रकुम (पूर्वी भाग)

४. योजना निर्माण सुरु मिति: २०८२/०९/०१

५. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/०९/२४

६. सम्झौता रकम: ४,७९,६६४.८२

७. योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: सन्तोषजनक

८. निर्माण उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: ७९,६६४.८२

९. योजनाबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन सके अवस्था: रहेको

१०. सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिक्षण: २०८२/१०/०५

११. कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा र प्रतिबद्धता:

१२. अनुगमन कर्ता / समितिको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन:

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क्र.सं. नाम थर पद

१. सशिधर बुढा वडा अध्यक्ष(अनुगमन समिति संयोजक)

२. गोविन्द के सी वडा सचिव (सदस्य)

३. हिमराज पुन मगर वडा प्राविधिक (सदस्य)

४. दिजिता खड्का भण्डारी वडा सदस्य/वडाका अन्य कर्मचारी

हस्ताक्षर

१. सशिधर बुढा

२. गोविन्द के सी

३. हिमराज पुन मगर

४. दिजिता खड्का भण्डारी

वडा अध्यक्ष(अनुगमन समिति संयोजक)

वडा सचिव (सदस्य)

वडा प्राविधिक (सदस्य)

वडा सदस्य/वडाका अन्य कर्मचारी

हस्ताक्षर

१. सशिधर बुढा

२. गोविन्द के सी

३. हिमराज पुन मगर

४. दिजिता खड्का भण्डारी

वडा अध्यक्ष(अनुगमन समिति संयोजक)

वडा सचिव (सदस्य)

वडा प्राविधिक (सदस्य)

वडा सदस्य/वडाका अन्य कर्मचारी

हस्ताक्षर

१. सशिधर बुढा

२. गोविन्द के सी

३. हिमराज पुन मगर

४. दिजिता खड्का भण्डारी



अनुसूची-३
आधिकारिक रूपमा

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिएको वडा स्तरीय योजना अनुगमन प्रतिवेदन

मिति: २०८२/११/१६

१. योजनाको नाम: आचार्यपुर सिमलुवा युद्ध स्मृति स्तूप

२. योजना निर्माण उपभोक्ता समिति: आचार्यपुर सिमलुवा युद्ध स्मृति स्तूप स्तूप स्तूप

३. योजना निर्माण स्थल: सिस्ने गा. वि. व. २ पुर्ण्ड्रिकुम (पूर्व)

४. निर्माण सुरु मिति: २०८२/१०/१०

५. योजना सम्पन्न भएको मिति: २०८२/११/१६

६. सम्झौता रकम: ५,५०,०००.००

७. योजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा गुणस्तर: सन्तोषजनक

८. निर्माण उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता: २०००.००

९. योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सके अवस्था: रहेको

१०. सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परिक्षण: २०८२/११/१६

११. कार्यान्वयन गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा र प्रतिबद्धता:

१२. अनुगमन कर्ता / समितिको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन:

अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरू

क्र.सं. नाम थर पद

१. श्री. कृष्ण बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष(अनुगमन समिति संयोजक)

२. श्री. ज्ञानेश्वर खड्का वडा सचिव (सदस्य)

३. श्री. राम प्रसाद वडा प्राविधिक(सदस्य)

४. श्री. दिनेश खड्का वडा सदस्य/वडाका अन्य कर्मचारी

हस्ताक्षर

१. श्री. कृष्ण बहादुर खड्का

२. श्री. ज्ञानेश्वर खड्का

३. श्री. राम प्रसाद

४. श्री. दिनेश खड्का

वडा अध्यक्ष(अनुगमन समिति संयोजक)

वडा सचिव (सदस्य)

वडा प्राविधिक(सदस्य)

वडा सदस्य/वडाका अन्य कर्मचारी

हस्ताक्षर

१. श्री. कृष्ण बहादुर खड्का

२. श्री. ज्ञानेश्वर खड्का

३. श्री. राम प्रसाद

४. श्री. दिनेश खड्का

वडा अध्यक्ष(अनुगमन समिति संयोजक)

वडा सचिव (सदस्य)

वडा प्राविधिक(सदस्य)

वडा सदस्य/वडाका अन्य कर्मचारी

हस्ताक्षर

१. श्री. कृष्ण बहादुर खड्का

२. श्री. ज्ञानेश्वर खड्का

३. श्री. राम प्रसाद

४. श्री. दिनेश खड्का

आज मिति २०८२/०१/१८ गते यसू डी लोजन्य
आद्यालयत विद्यालय पाठ्याग पिछने इको विद्यालय
अनुगमन गर्ने अवर जल भयो अनुगमनको क्रममा
विद्यालयको अवस्था देख्यबमोजिम भएको पाइयो.

खुबल पत्र:

- सन शिक्षक कर्मचारी उपस्थिति भएको
- विद्यार्थी उपस्थिति राम्रो.
- विद्यालय स्वास्थ्य प्रभाव
- खेलमदान भएको

बुझा गर्नुपर्ने पत्रहरू:

- गाउँपालिकाले जल उपकरणहरूको सम्भार गर्न पलना गर्ने गराउने
- कार्यालय र विद्यालय परितः सरुकाई राख्ने
- शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भए लगत्तै हाजिरी गर्ने गराउने
- विद्यार्थी धेरै कम मात्रा उपस्थित भएताे सम्भारको लागि खोज गरी वास्तविक निवरण पेश गर्ने गराउने र ईष्टिमि मा मिलाउने
- विद्यालय अवस्थापन समिति बैठक नियमित गर्ने गराउने
- निरन्तर सम्भार पुष्टिकाको गर्न रूपमा कार्यान्वयन गर्ने
- विद्यालयको आगोले अवस्थापन खुला हुन्छ राख्ने
- शिक्षक बुझा योजना निर्माण गरी लागू गर्ने
- शिक्षक विद्यार्थी पोशाकलाई अनिवार्य गर्ने गराउने
- स्वास्थ्यको लेखापरीक्षा समिति गर्ने गराउने
- विद्यालय स्वास्थ्य बैठक गर्ने अवस्था गर्ने

अन्तमा भए विधानपत्रा खुला गर्नुपर्ने लाई
 भए खुला गर्ने हुँदा अझै पत्रहरूलाई आगामी
 दिनेहरूमा सबै परिवारवालाहरूको सम्मानमा गरी
 खुला गरेको देख्न पाइयो र शुभकामना छ ।

उपस्थिति

- १) गोपाल रेग्मी उपाध्यक्ष फिर्तने गाउँपालिका
- २) तिलक गौतम इकाई अध्यक्ष सि. वि. तथा के. आई
- ३) डिल्ली खड्का उ. प्र. अधिकृत फिर्तने गा. पा.
- ४) हेराम खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ फिर्तने गा. पा.
- ५) मरान फिर्त कुल शिक्षा अधिकृत फिर्तने गा. पा.

A

उत्तराखण्ड

A

1

1

1

1

1

उपाधिभातिः

1



५ न वडा टल विकास कार्यको सुझाव



खारा - टाकुरा मलक एतइन्नती सम्पन्न



वडा नं ७ धैल्ची सडक कार्य



સંયુક્ત અગ્રગમત ગિદ્દી વાલુવા સાઠોબેરી



६ न वरा सडक ज्याविको काम



सिस्ने गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रूकुमकोट, रूकुम (पूर्वी भाग)


आयोजना सूचनापट्टी

१. उपलोक साविकको नाका: अगड्डी डाँडा वैद्य विडिल
जैत सक्न सक्न बर्तन उपलोक साविक
आयोजना स्थल: सिस्ने-०८, रूकुम (पूर्वी भाग)
आयोजनाको उद्देश्य: मोटरबाटो निर्माण
आयोजनाको नाका: गैराज पुल
आयोजनाको अनुमानित रू. १,००,०००
गाउँपालिका अनुदान रू. १,५३,९०५.५८
२. जलपानको नाका: रू. १,५३,९०५.५८
३. कुल लागत रकम रू. १०,५३,९०५.५८
४. आयोजना सुरु मिति: २०८२/०९/१८
५. कार्य सम्पन्न हुने मिति: २०८२/१०/२०
६. प्राथमिक सहयोग: सिस्ने गाउँपालिका







वडा नं २ किदा स्कूल


बसा मे ७ बसा कार्यनाथ

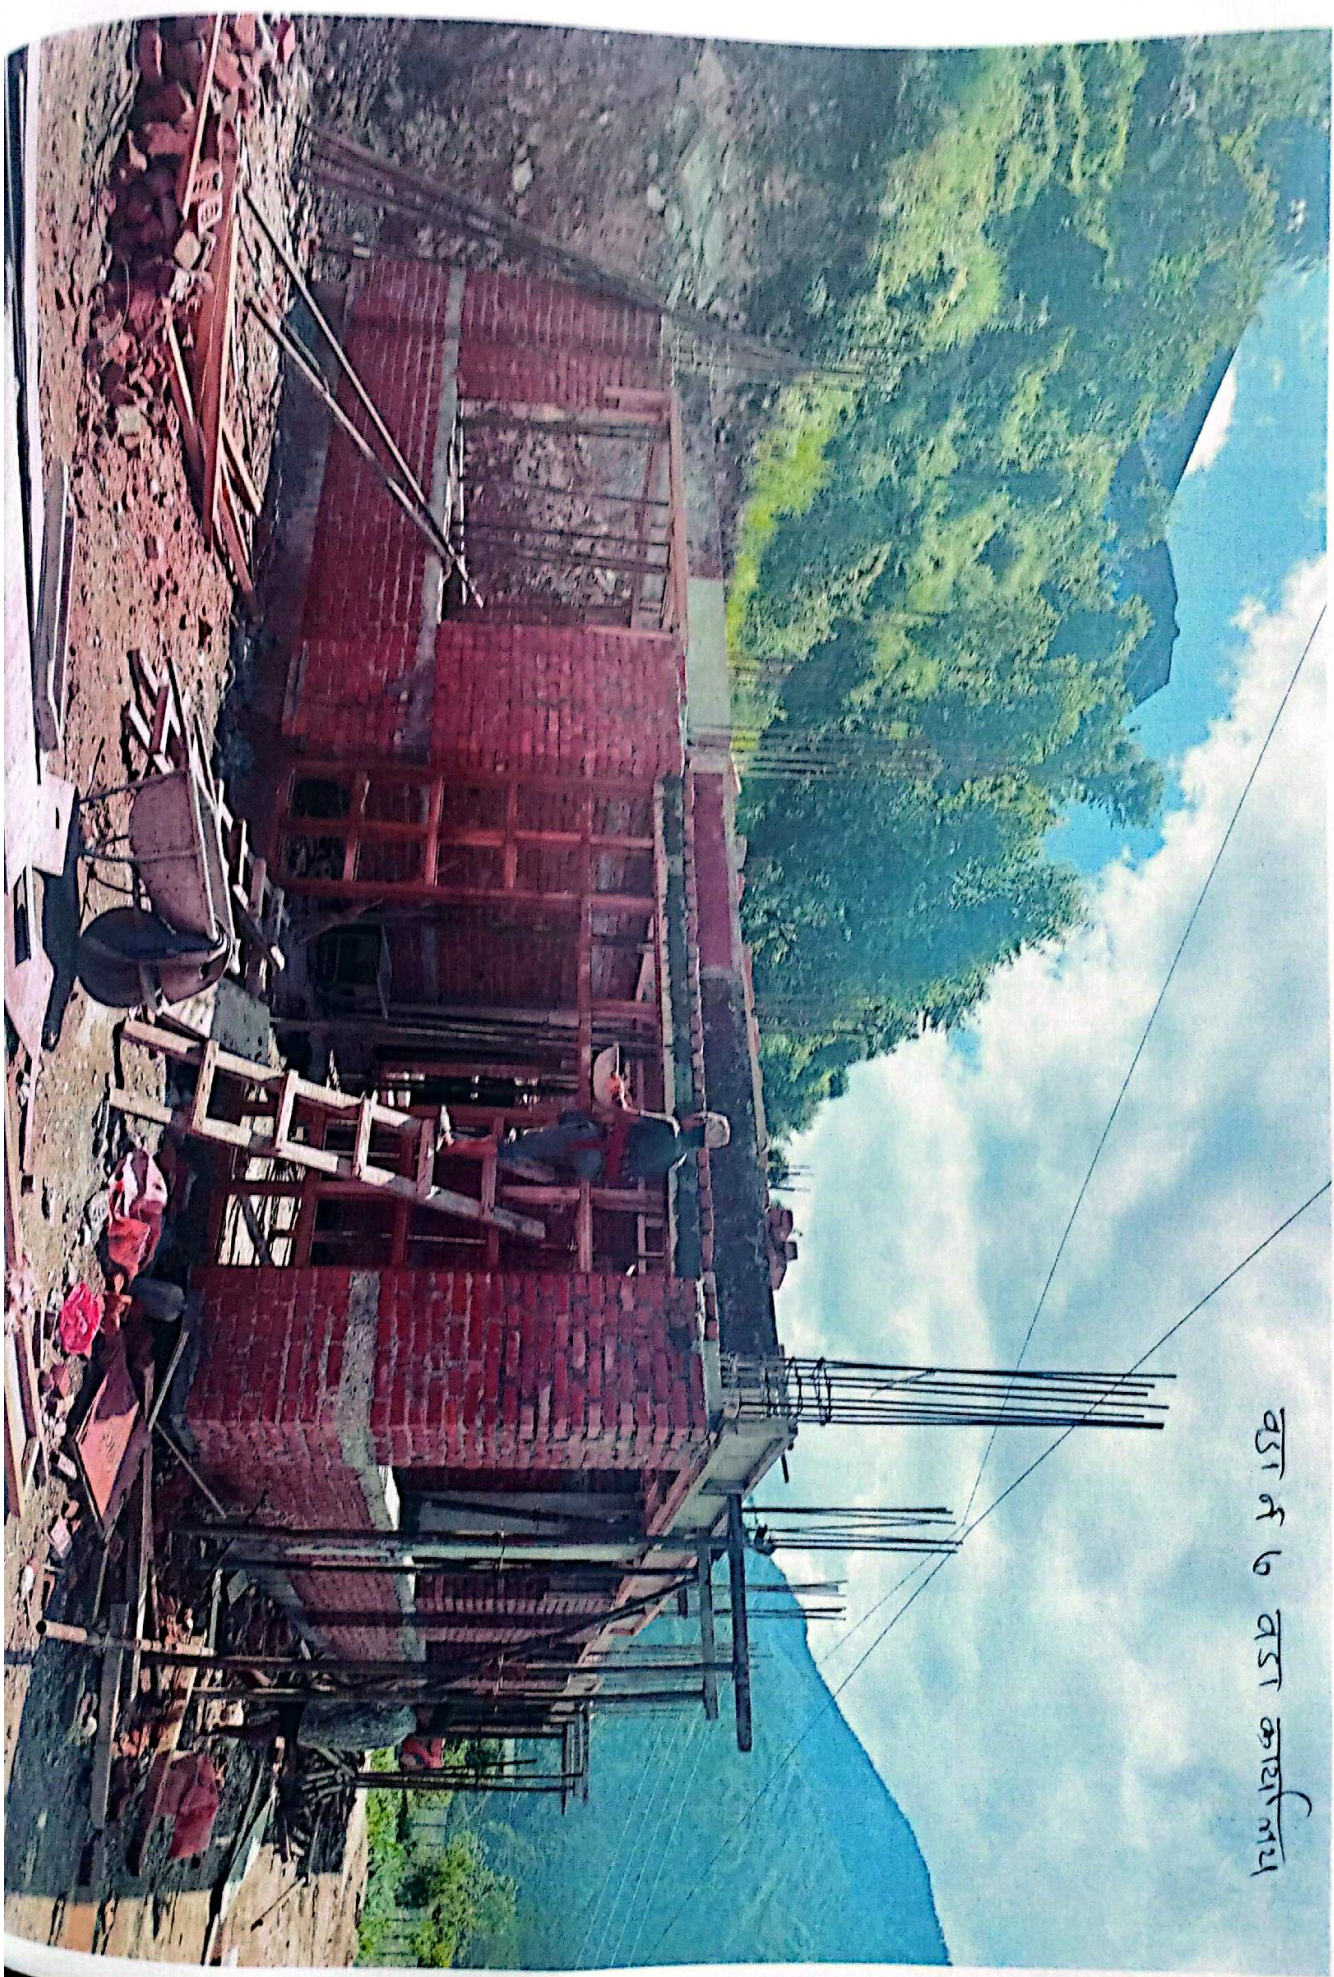


❖ निर्माण योजना अनुगमन गर्दाका नमुनागत फोटोहरू:

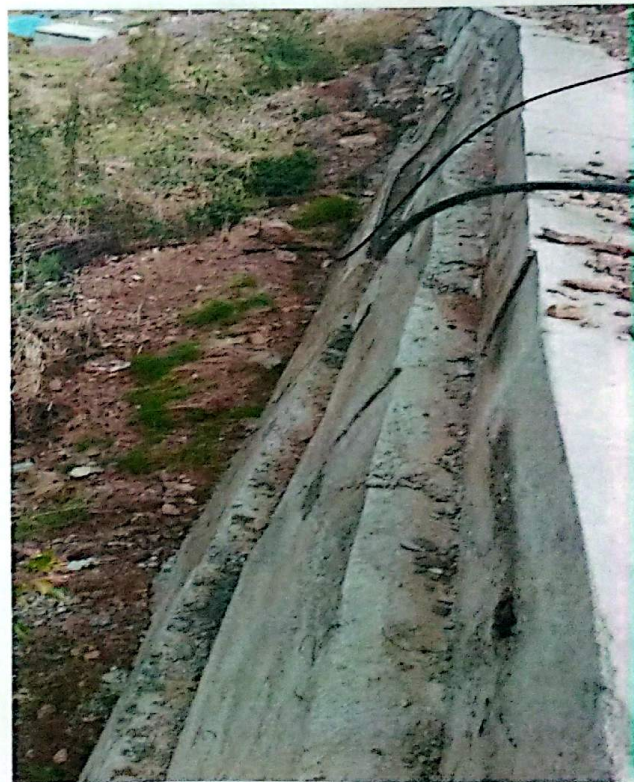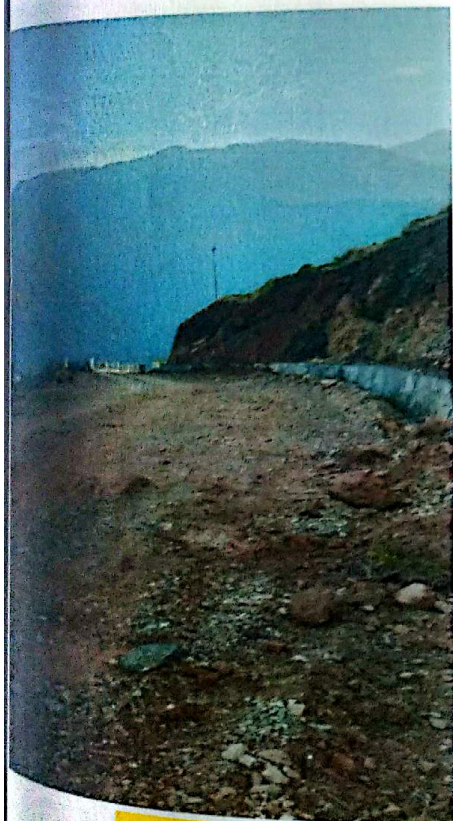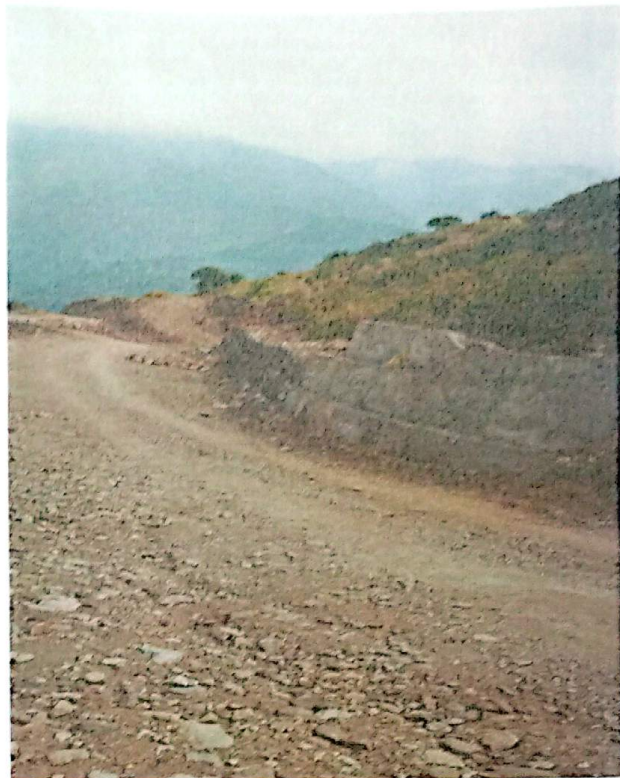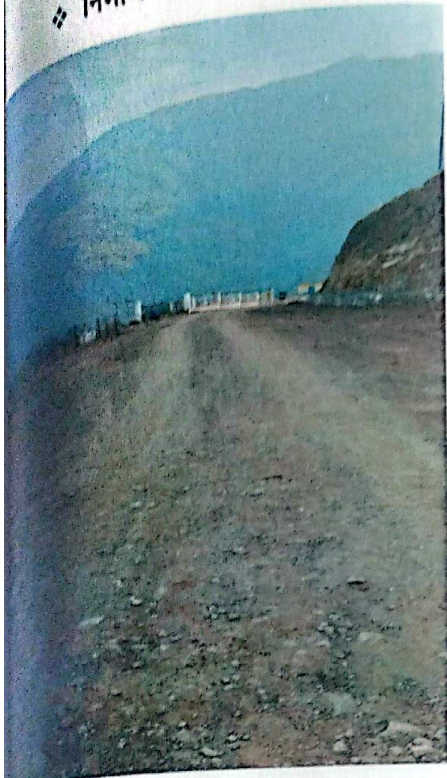





हाइवे देखि मैदान हुदै पुरानो स्कुल सम्म सडक स्तर उन्नती

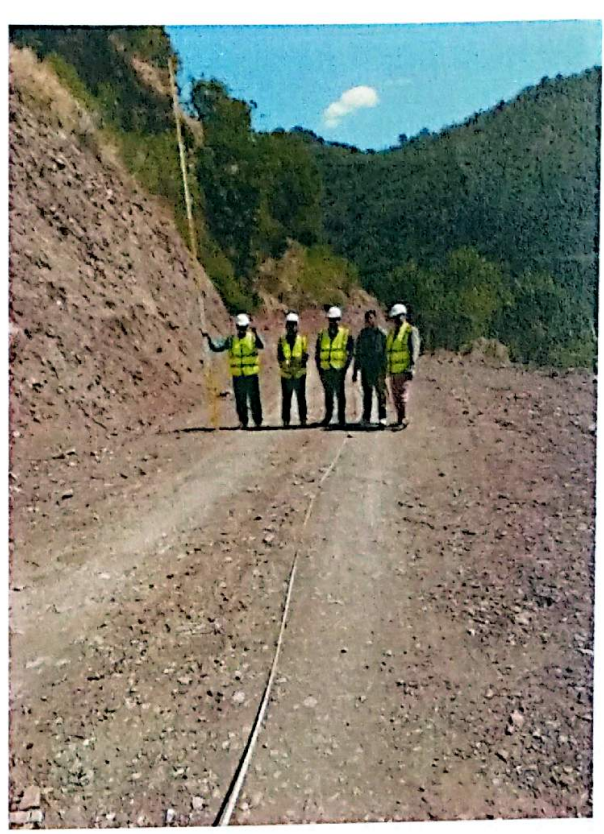



धाउने अमलाचौर तितेखोला सडक स्तरोन्नती

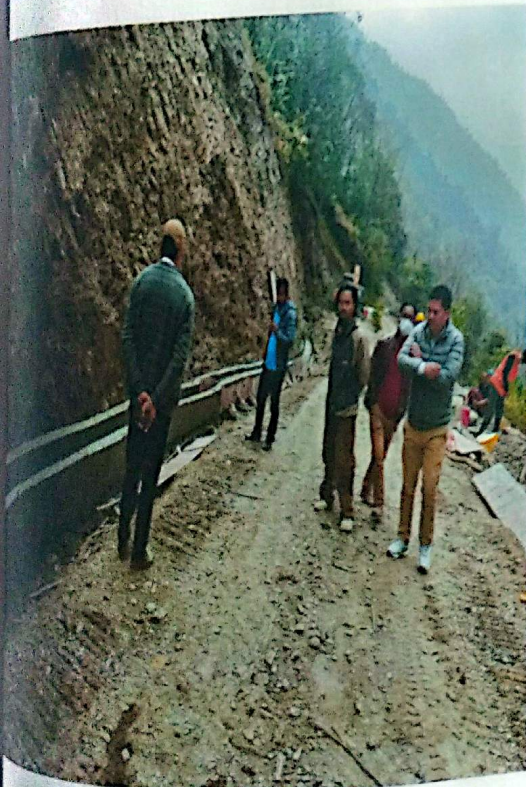

कोछे वडा कार्यालय कानेबाङ र बैसपानी स्यालापाखा झिमखोला सडक स्तरोन्नती

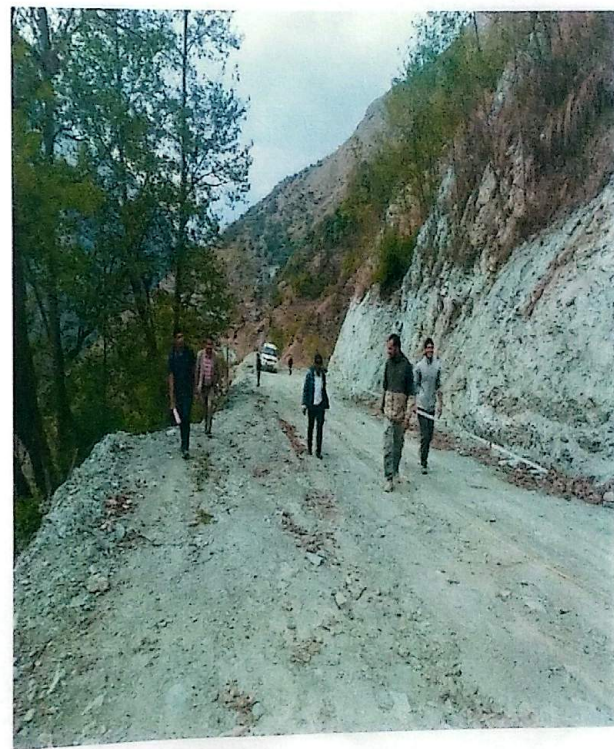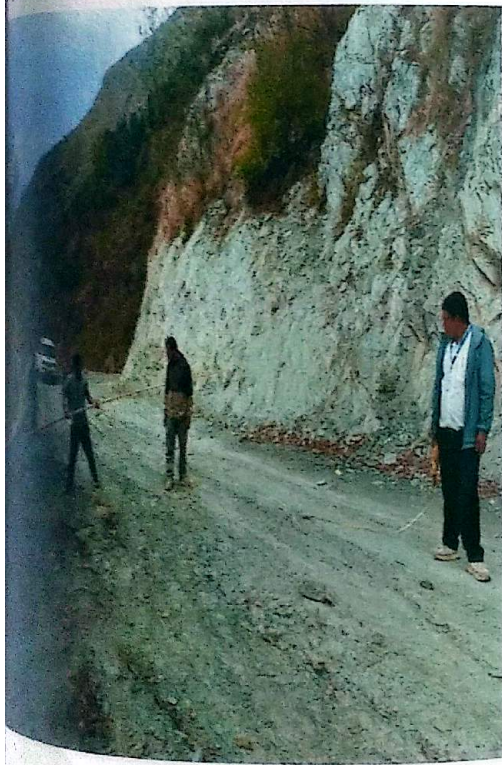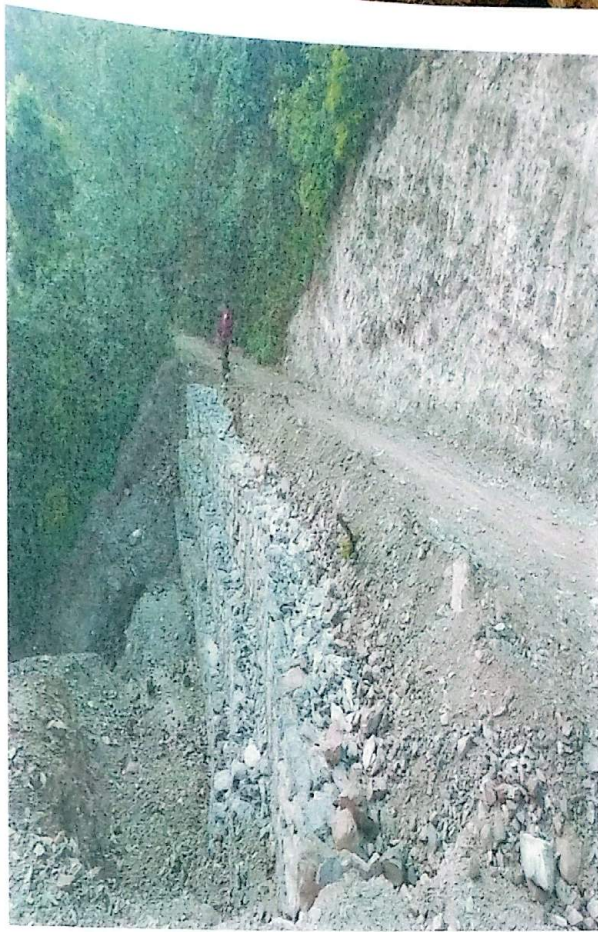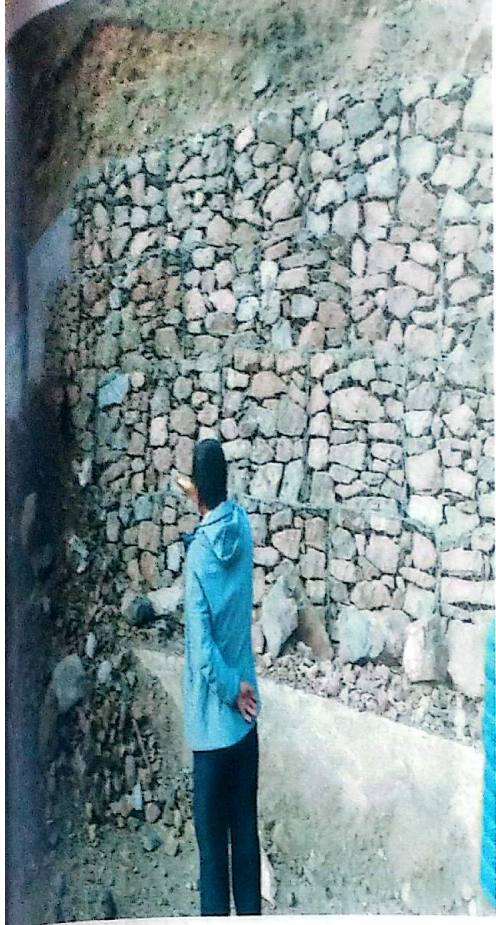

कोरबास- खोपिचार-होर्दिङ सडक स्तरोन्नती

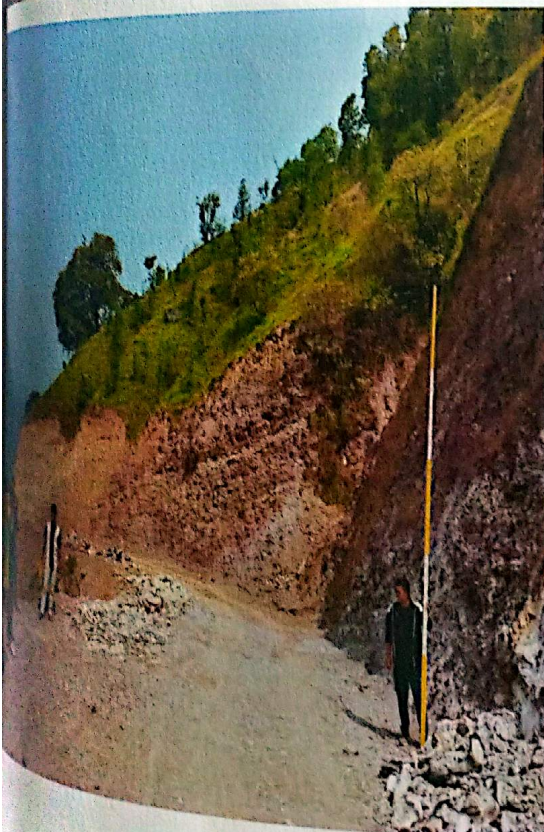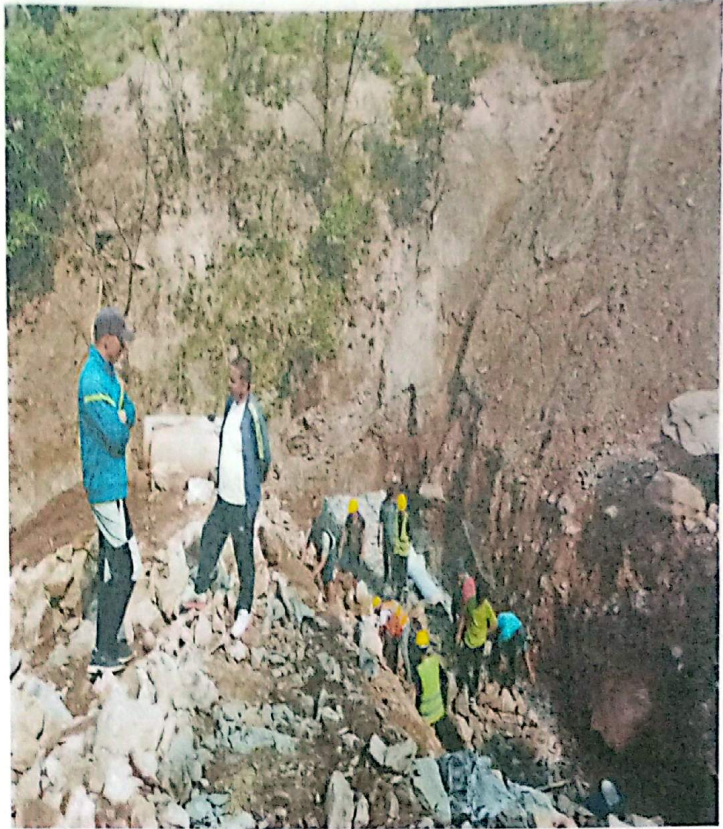

तितेखोला अमलाचौर धाउने सडक स्तरउन्नती



श्री जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा भवन निर्माण

❖ अनुगमनको निष्कर्ष:

- क. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन भएका योजनाहरू स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्ययोजना अनुसार सम्पन्न भएका छन्।
- ख. अनुगमन बाट अधिकांश योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइयो
- ग. उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीले गुणस्तर, पारदर्शिता र समयपालनामा थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको पाइयो।
- घ. यवजनाका कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित शाखा प्राविधिक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने देखियो।
- ङ. आयोजनामा उपभोक्ताहरूको लागत साझेदारी (जनसहभागिता) न्यून देखिएकोले लागत साझेदारीमा जिम्मेवार बनाई आयोजनाको अवनतत्व कायम हुने वातावरणको सृजना गर्ने।

८. प्रमुख उपलब्धिहरू:

- क. पूर्वाधार विकास: सडक, पुल, भवन, सिंचाई, ढल, खानेपानी, प्रतिकक्षालय, गोरेटो तथा घोरेटो बाटो निर्माण।
- ख. शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार
- ग. रोजगारी सृजना
- घ. पारदर्शिता र सामाजिक लेखापरीक्षणमा सुधार

९. समस्याहरू:

- आ.व. २०८२/०८३ मा योजना तथा अनुगमन शाखाले तपसिल बमोजिमका समस्याहरू औल्याएको छ ।
- क. संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटमा ढिलाई,
- ख. दिइएको समयसिमा भित्र उपभोक्ता र ठेकेदारले काम सम्पन्न नगर्नु,
- ग. दक्ष जनशक्तिको न्यूनता,
- घ. सम्झौता भए लगत्तै काम सुचारु नगर्नु,
- ङ. निर्माण कार्य स्थलमा सूचना पाटीको टाँस गर्ने परिपाटी नबस्नु,
- च. कर्मचारीको कार्य व्यस्तता तथा अभाव देखाई समयमा योजनाको अनुगमन नगर्नु,
- छ. योजना सफ्टवेयरको सुचारु नगर्नु,
- ज. ठेकादारहरूको ढिलासुस्ती,

- झ. स्थानीय जनसहभागीताको कमी,
- ञ. आवश्यक श्रोत र साधनको कमी,
- ट. निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नाफा मुखी मानसिकता (जनश्रमदान गर्न र गराउन नसक्नु)
- ठ. भौगोलिक विकटता,
- ड. छरिएको बस्तीहरु
- ढ. आवश्यकता भन्दा न्यून बजेट।

१०. सुझावहरु:


- क. अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने,
- ख. अनुगमन पश्चात पृष्ठपोषण, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने,
- ग. नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्ने,
- घ. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजालाई योजना कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषणको रुपमा प्रयोग गर्ने पद्धतिको रुपमा विकास गर्ने,
- ङ. योजना सफ्टवेरको विकास गर्नु पर्ने,
- च. स्वतन्त्र तथा तेस्रोपक्षबाट पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यका लागि आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नु पर्ने,
- छ. सार्वजनिक सरोकारका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा लाभग्राही सरोकारवालाहरुलाई समेत संलग्न गराउनु पर्ने,
- ज. निर्माण उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुले सझौता लगतै काम सुचारु गर्नुपर्ने,
- झ. योजना निर्माण स्थलमा सूचना पाटी (होडिड बोर्ड) टाँस गर्नु पर्ने,
- ञ. समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई खबरदारी गरी अटेर गरेमा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने।

११. उपसंहार:

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा योजना तथा अनुगमन समितिले गाउँपालिकाको विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अनुगमनका क्रममा प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रकृत्यालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। आगामी वर्षहरुमा समयमै योजना सम्पन्न गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तर्फ विशेष ध्यान दिएर

सशक्त र प्रभावकारी रुपमा योजना कार्यान्वयन गर्दै गएमा लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम (पूर्वी भाग) मा रहेको सिस्ने गाउँपालिका भौतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्त्रण तर्फ केन्द्रित हुँदै सामाजिक एकता, आर्थिक समृद्धि, सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सहित "समृद्ध सिस्ने, हाम्रो गन्तव्य" को यात्रा साकार हुने देखिन्छ।




प्रतिवेदक गोपाल रेउले
गा.पा. उपाध्यक्ष

अनुगमन समिति संयोजक

सिस्ने गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
रुकुम (पूर्वी भाग)
